ឯកសារបាយការណ៍ · PDF

ស្កេន QR Code
ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង

សូមប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទស្កេន QR Code ឬចុចប៊ូតុងទាញយក ដើម្បីបើក និងទាញយកឯកសារ PDF របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។

បន្តទៅទំព័រដើម →



MME Progress Report


គម្រោង

ការងាររៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ និងវិស័យប្រេងកាត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, វិស័យរ៉ែ, វិស័យប្រេងកាត

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំប្រព័ន្ធសម្រាប់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ និងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត

ចាប់ផ្តើមបទបង្ហាញ →

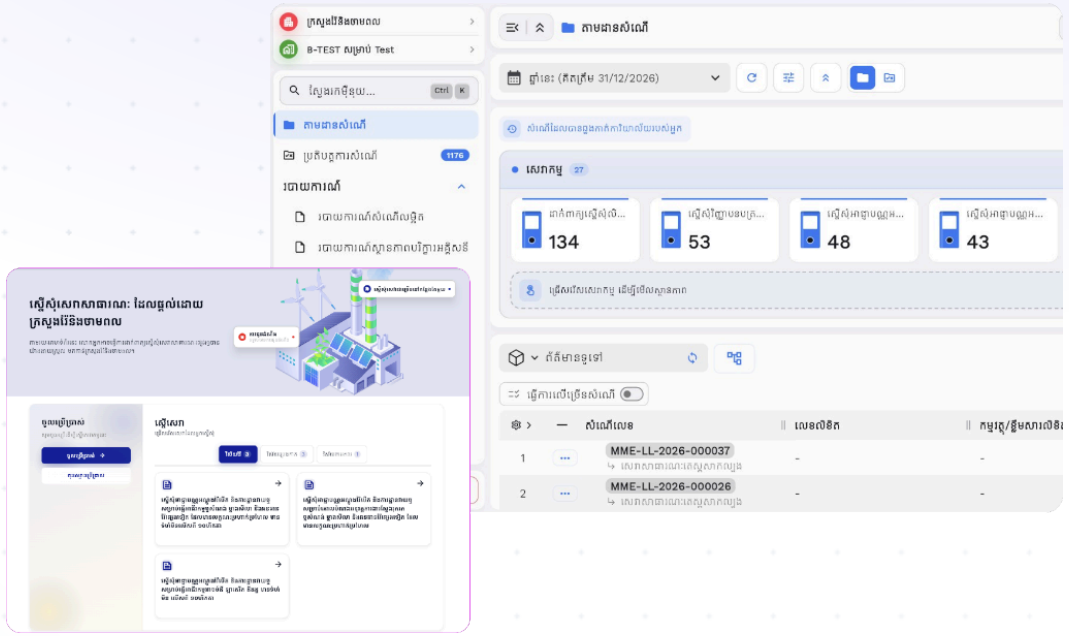

រៀបចំ និងអនុវត្តដោយ
OONE Power Technology Co., Ltd

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · វឌ្ឍនភាពគម្រោងទី១ (សមាសភាគទី១ ដល់ទី៥)

ការវិភាគស្ថានភាពមុខងារទាំង ១០ (៥ សមាសភាគ)


គម្រោងទី១



- ដាក់ដំណើរការផ្លូវការ (1.3 · 100%) — 1 មុខងារ
- រៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (2.1, 5.1–5.3 · 60%–70%) — 4 មុខងារ
- សិក្សាតម្រូវការ (1.1, 1.2, 3, 4 · 10%) — 4 មុខងារ
- រង់ចាំសិក្សាបន្ថែម (2.2) — 1 មុខងារ

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសមាសភាគ

0% – 100%

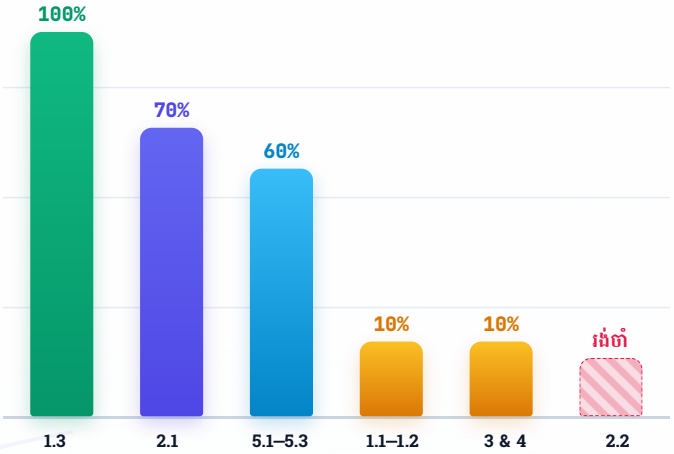

1. សមាសភាគទី1

៣ មុខងារ

- 1.1 ការងារថែទាំ និងជួសជុល (10%) — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.2 ការងារផ្គត់ផ្គង់ (10%) — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.3 សេវាបន្ទប់ប្រជុំ (100%) — 100%
  បានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ (100%)

2. សមាសភាគទី2 & 3. សមាសភាគទី3

បេសកកម្ម, ប៉ៀវត្ស & ទ្រព្យរដ្ឋ

- 2.1 ការស្នើសុំបេសកកម្ម (70%) — 70%
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (70%)
- 2.2 ដំណើរការប្រាក់ប៉ៀវត្ស (រង់ចាំការសិក្សាបន្ថែម) — រង់ចាំសិក្សា
  រង់ចាំការសិក្សាជាមួយក្រសួងបន្ថែម
- 3 សមាសភាគទី3៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

4. សមាសភាគទី4

10%

- 4 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែនការ ថវិកា និងការអនុវត្ត ព្រមទាំងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ — សិក្សាតម្រូវការ 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)


5. សមាសភាគទី5 (60%) សម្រាប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

60% · ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់

- 5.1 ការគ្រប់គ្រងឯកសារចូល/ចេញ និងឯកសារកាលប្បវត្តិ
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 5.2 ការផ្ទុក និងគ្រប់គ្រងឯកសារផ្ទៃក្នុង (Upload and Manage Internal Documents)
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 5.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · កាលវិភាគគម្រោងទី១ (វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី១

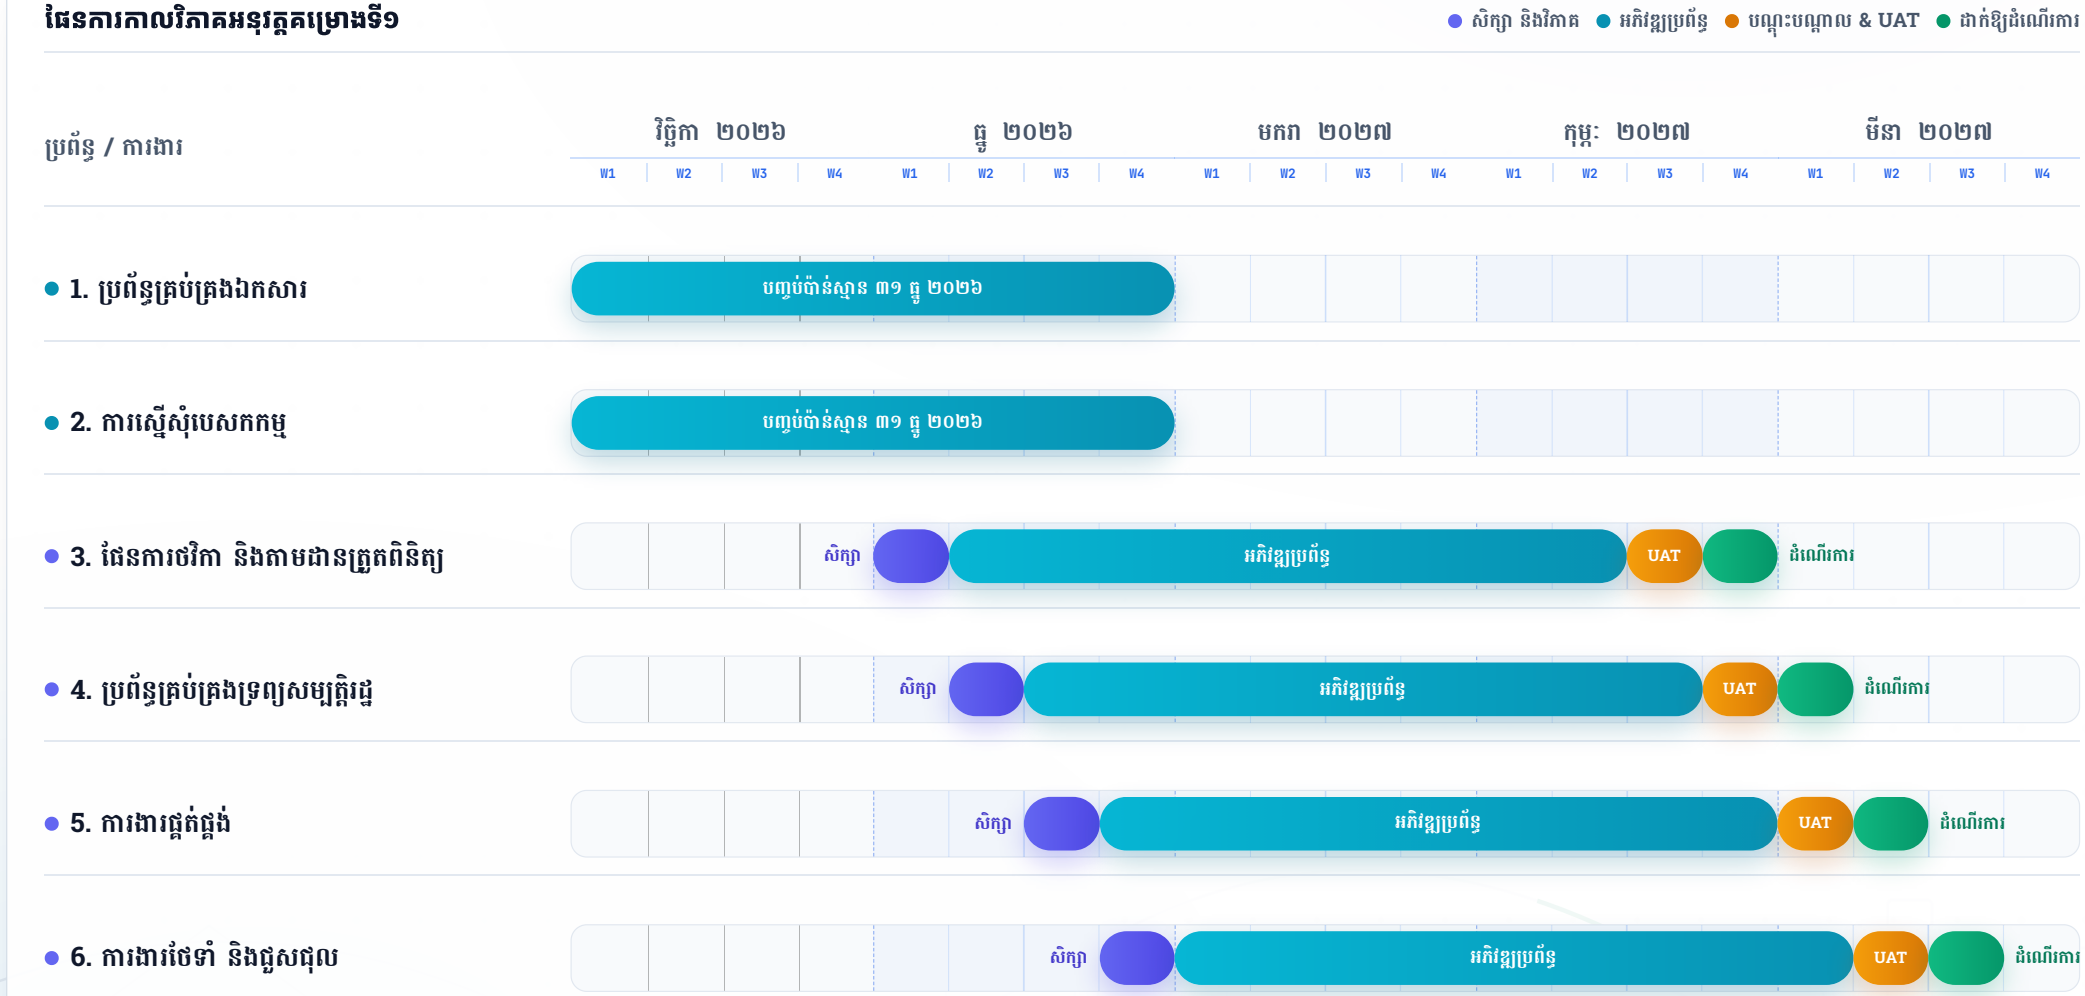

II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · ការងារៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ

ការវិភាគស្ថានភាពសេវាទាំង ៣ (២ Web Portal)


គម្រោងទី២



- 1. Web Portal អ្នកស្នើសុំ (រួចរាល់) — 3 សេវា
- 2. Web Portal ផ្ទៃក្នុង (លំនាំដើមទី១) — 1 សេវា
- 2. រៀបចំតាមលំនាំ 2.1 (2.2 & 2.3) — 2 សេវា
- 3. រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម — 2.2 & 2.3

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសេវាទាំង ៦

0% — 100%

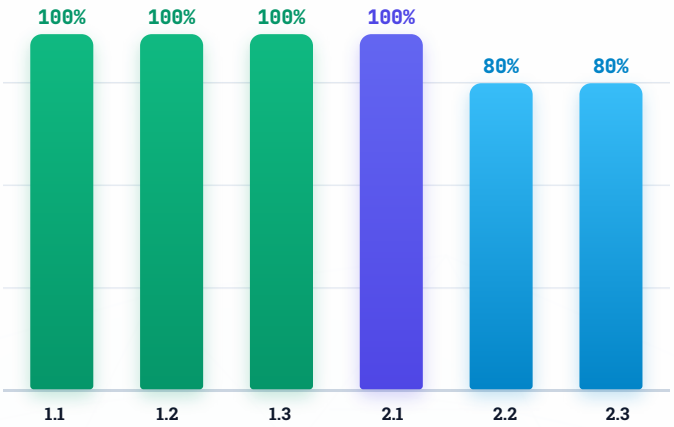

1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

1.1 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ទាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

1.2 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរកកថ្មសំណង់ ម្ទាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

1.3 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

2. Web Portal សម្រាប់ការងារផ្ទៃក្នុង (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

2.1 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ទាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal អ្នកស្នើសុំ និងផ្ទៃក្នុង រៀបចំរួចរាល់

2.2 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរកកថ្មសំណង់ ម្ទាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 80%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

2.3 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 80%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

3. ចំណាំសម្គាល់៖

រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

3 សម្រាប់ការរៀបចំសេវាទី2 និងទី3 ក្រុមការងារបានរៀបចំតាមលំនាំសេវាទី1 រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួលតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ — តាមលំនាំសេវាទី1

Web Portal អ្នកស្នើសុំ (៣ សេវា) និង Web Portal ការងារផ្ទៃក្នុង (៣ សេវា) បានរៀបចំរួចរាល់

II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · កាលវិភាគគម្រោងទី២ (១៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ – ៣១ មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី២ (Project 2 – GDMR)

ដំណាក់កាលការងារ | វិច្ឆិកា ២០២៦ | ធ្នូ ២០២៦ | មករា ២០២៧ | កុម្ភៈ ២០២៧ | មីនា ២០២៧

- 1. ការរចនា និងវិភាគ: ១៣ វិច្ឆិកា – ០៤ ធ្នូ
- 2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ: ០៧ ធ្នូ ២០២៦ – ០៥ កុម្ភៈ ២០២៧
- 3. ការធ្វើតេស្ត (UAT): ០៨ កុម្ភៈ – ១២ មីនា
- 4. ដាក់ឱ្យដំណើរការ: ១៥ មីនា – ៣១ មីនា

ដំណាក់កាល ១

1. ការរចនា និងវិភាគ

១៣ វិច្ឆិកា – ០៤ ធ្នូ ២០២៦

- ការវិភាគតម្រូវការប្រព័ន្ធ
- លំហូរការងារ និង SOP
- ការរចនាផ្ទាំង UI/UX
- ការអនុម័តលើការរចនា

ដំណាក់កាល ២

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

០៧ ធ្នូ ២០២៦ – ០៥ កុម្ភៈ ២០២៧

- បង្កើតទម្រង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
- ការអភិវឌ្ឍលំហូរការងារ
- រចាយការណ៍ និងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ
- ការធ្វើតេស្តសាកល្បងផ្ទៃក្នុង

ដំណាក់កាល ៣

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)

០៨ កុម្ភៈ – ១២ មីនា ២០២៧

- បទបង្ហាញប្រព័ន្ធជូនក្រសួង
- ការដាក់ដំណើរការសាកល្បង
- ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់
- ការធ្វើតេស្ត UAT និងចុះហត្ថលេខា

ដំណាក់កាល ៤

4. ដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

១៥ មីនា – ៣១ មីនា ២០២៧

- ការរៀបចំប្រព័ន្ធផលិតកម្ម
- ការដំឡើងប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង
- ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · Web Portal អ្នកស្នើសុំ & ផ្ទៃក្នុងក្រសួង

ការវិភាគស្ថានភាព (២ Web Portal)


គម្រោងទី៣



- បានរៀបចំរួចរាល់ (1.1, 1.2) — 2 សេវា
- សម្រេចបាន 75%–90% (1.3, 2.1, 2.2) — 3 សេវា
- តេស្តដល់ជំហានមន្ទីរខេត្ត (2.3) — 1 សេវា

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាព

0% – 100%

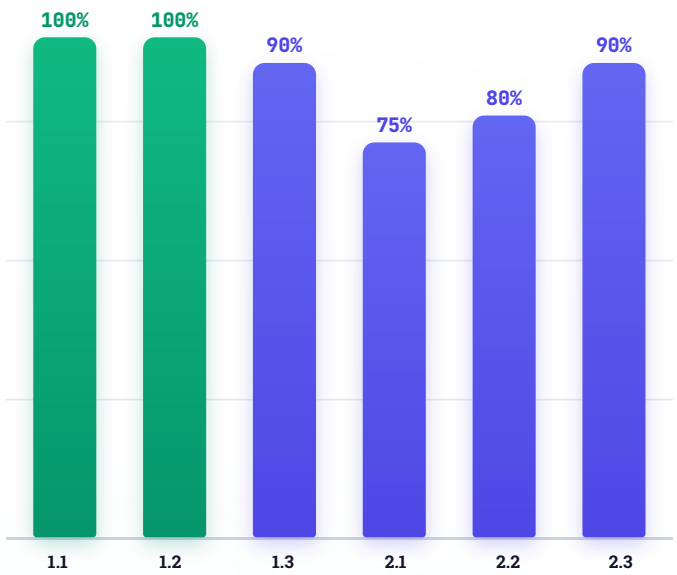

1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ

៣ សេវា

1.1 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.2 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.3 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ (90%) — 90%

(90%) មានការស្នើសុំកែសម្រួលបន្ថែមក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោង 2:30 PM។

2. Web Portal សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងក្រសួង

2.1 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ (75%) — 75%

2.2 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ (80%) — 80%

រង់ចាំតេស្តបន្ថែមជាមួយក្រុមការងារក្រសួង។

2.3 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ — 90%

2026/Nov/10 បានបន្តតេស្តសាកល្បងជាមួយនាយកដ្ឋាន និងមន្ទីរខេត្ត ដល់ជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង

2.4 មុខងារ Offline (ឧ. អោយ Save ទិន្នន័យ Auto ករណីដាច់ Internet) (5%) — 5%

3. ចំណាំ

សំណើរកែសម្រួលផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាន

ការរៀបចំផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង ពុំអាចរៀបចំដូចកំណត់ហេតុទាំងស្រុង ដោយការរៀបចំក្នុងប្រព័ន្ធ Field ខ្លះជាលក្ខណៈ Select ជ្រើសរើសទិន្នន័យ ហើយ Field ខ្លះជាតារាងជាលក្ខណៈ Popup form បញ្ចូលទិន្នន័យ។


3.1 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ

3.2 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · កាលវិភាគគម្រោងទី៣ (វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី៣ (Project 3 – GDP)

ថ្ងៃ វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧

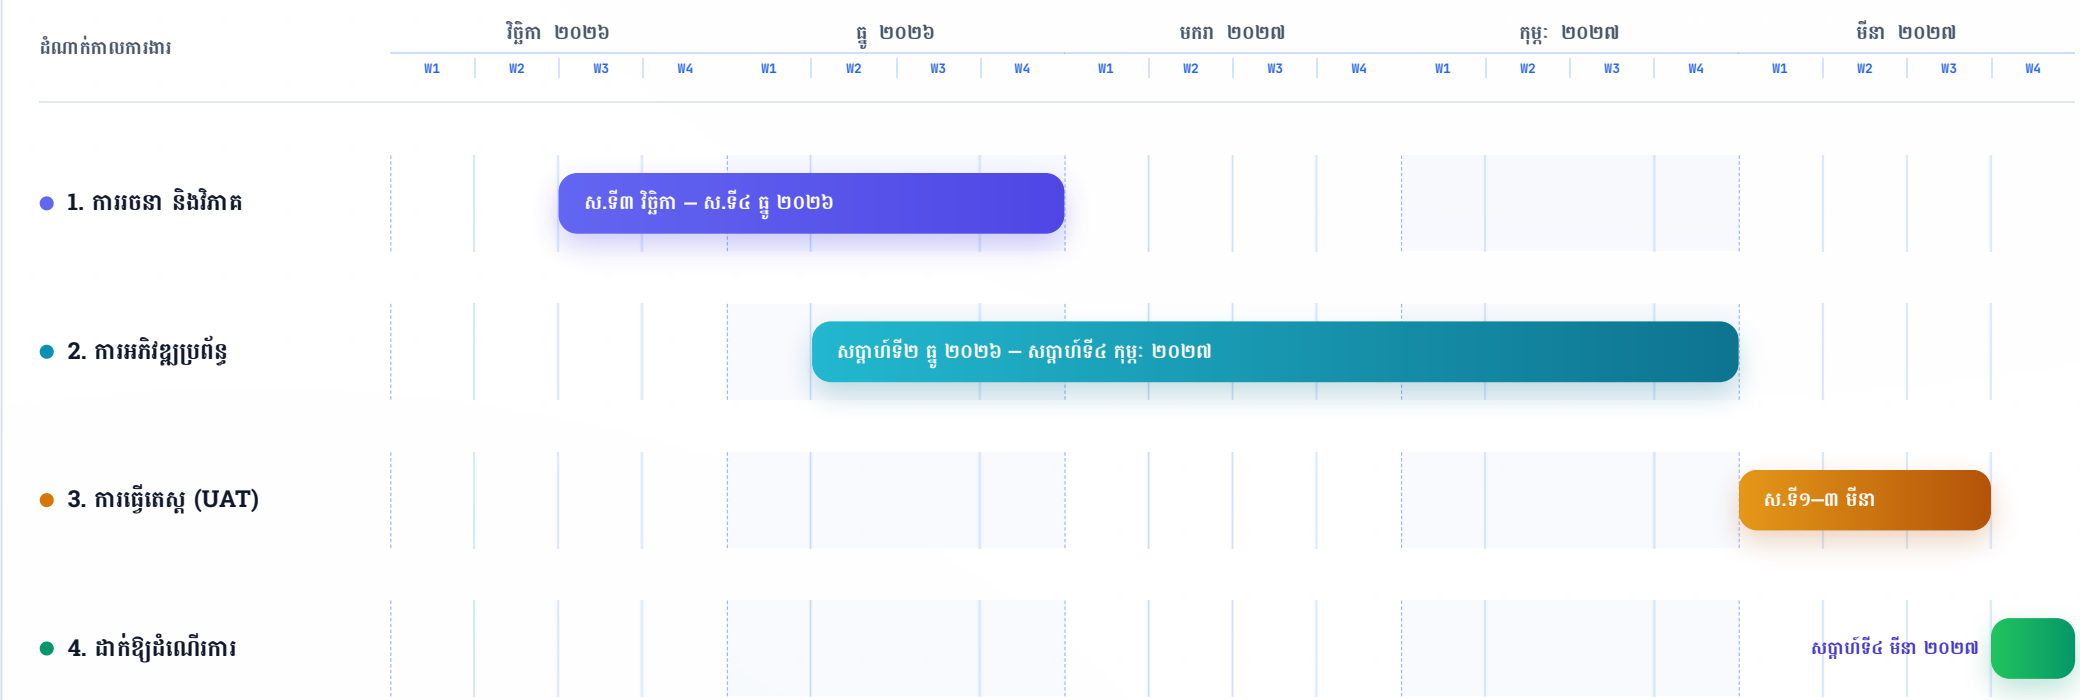

1. ការរចនា និងវិភាគ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ ធ្នូ ២០២៦

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី២ ធ្នូ ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ កុម្ភៈ ២០២៧

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី១ មីនា ២០២៧ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៣ មីនា ២០២៧

4. ដាក់ឱ្យដំណើរការ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី៤ មីនា ២០២៧

សំណួរ & ចម្លើយ

សូមអរគុណ

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងលោក-លោកស្រី ដែលបាន
ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងបទបង្ហាញនេះ។

ដៃគូបច្ចេកវិទ្យា

One
POWER TECHNOLOGY
